


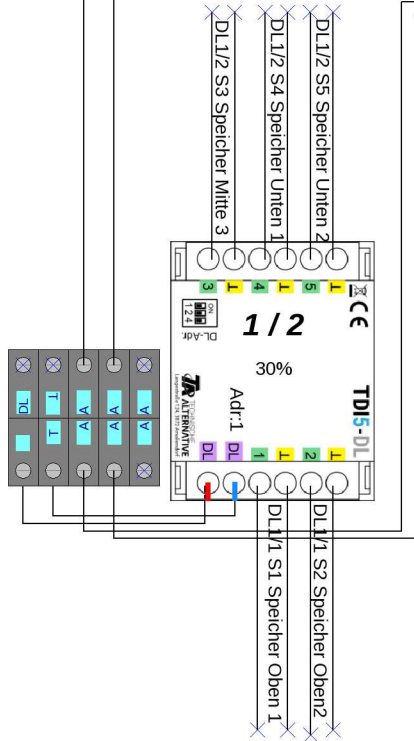

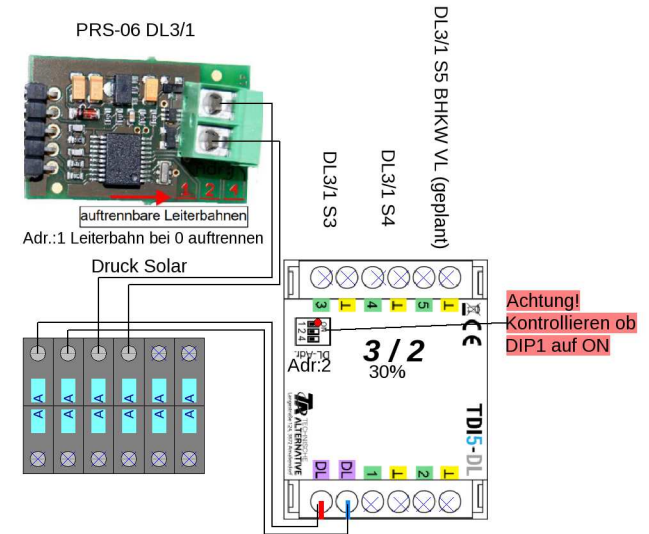


Achtung!
DIP2 auf ON

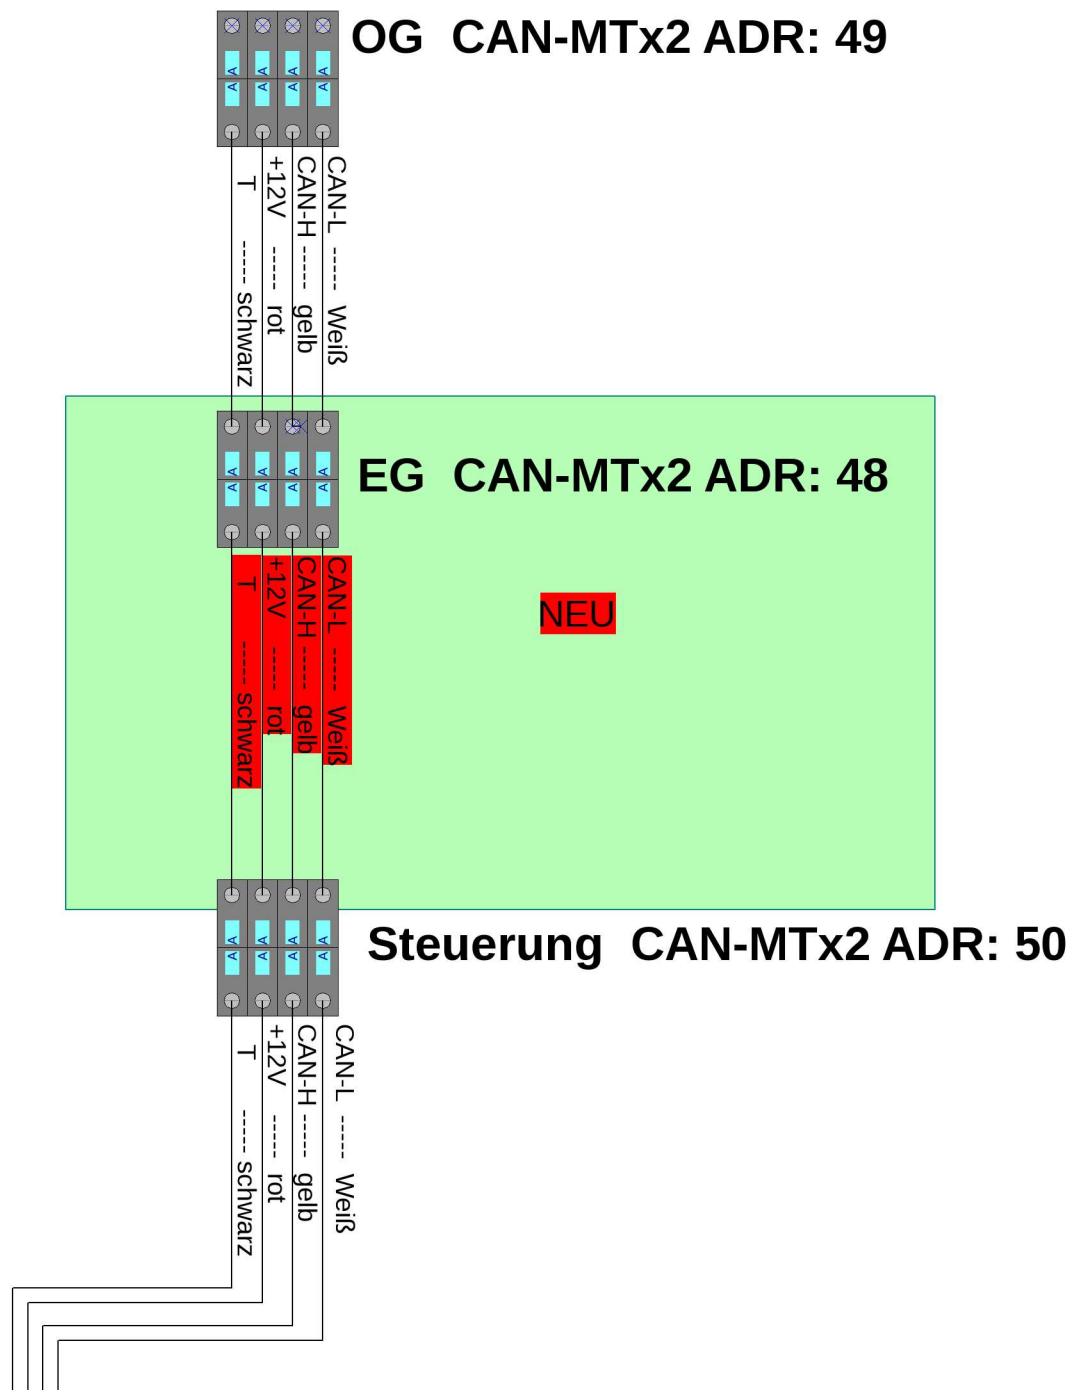

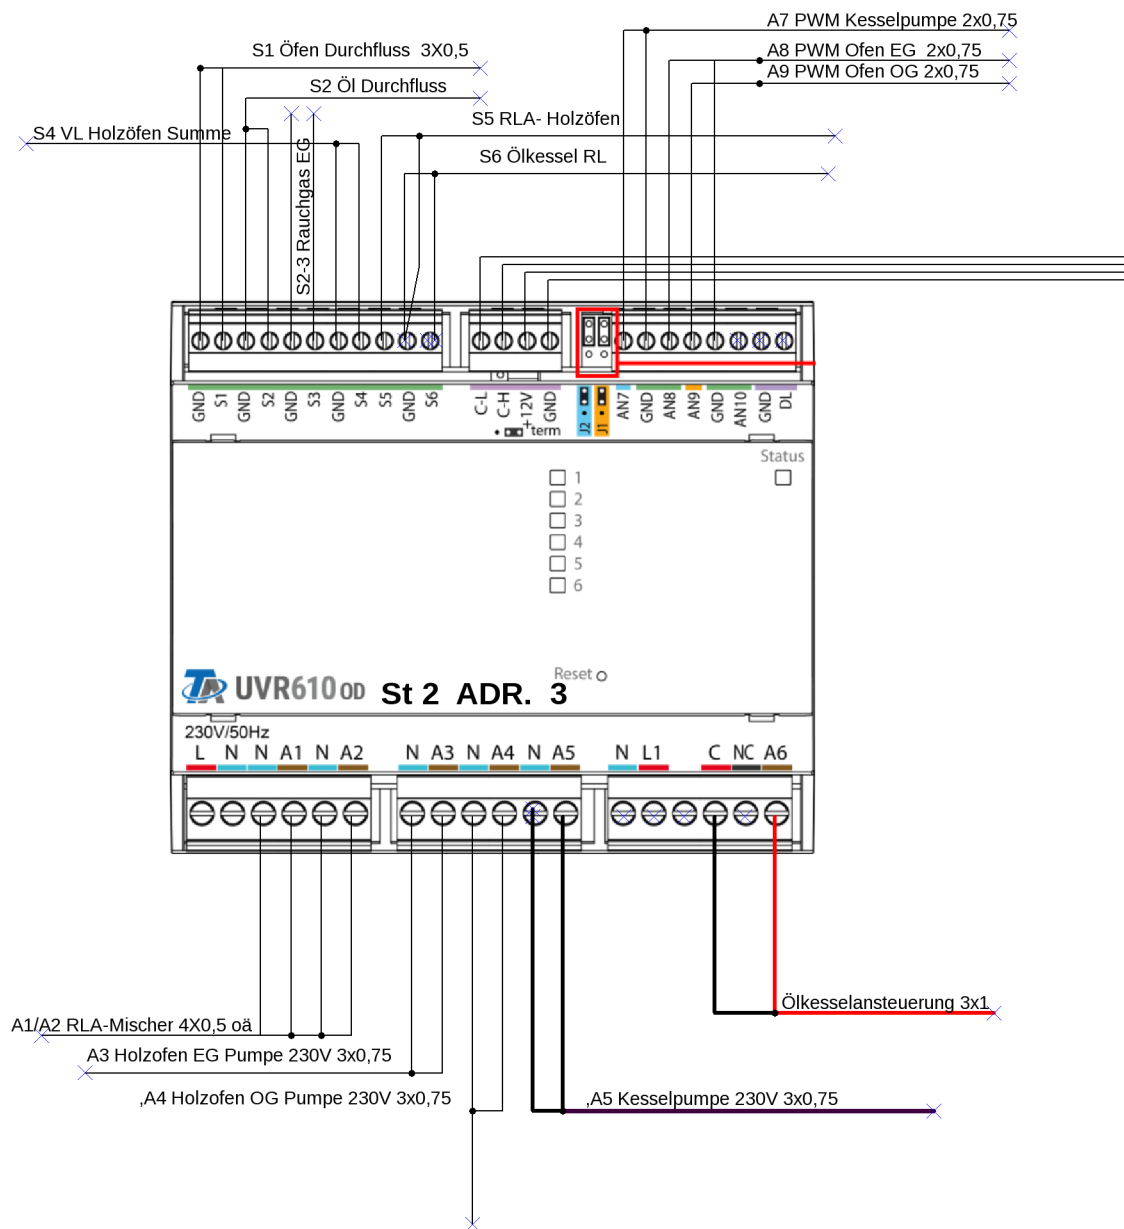

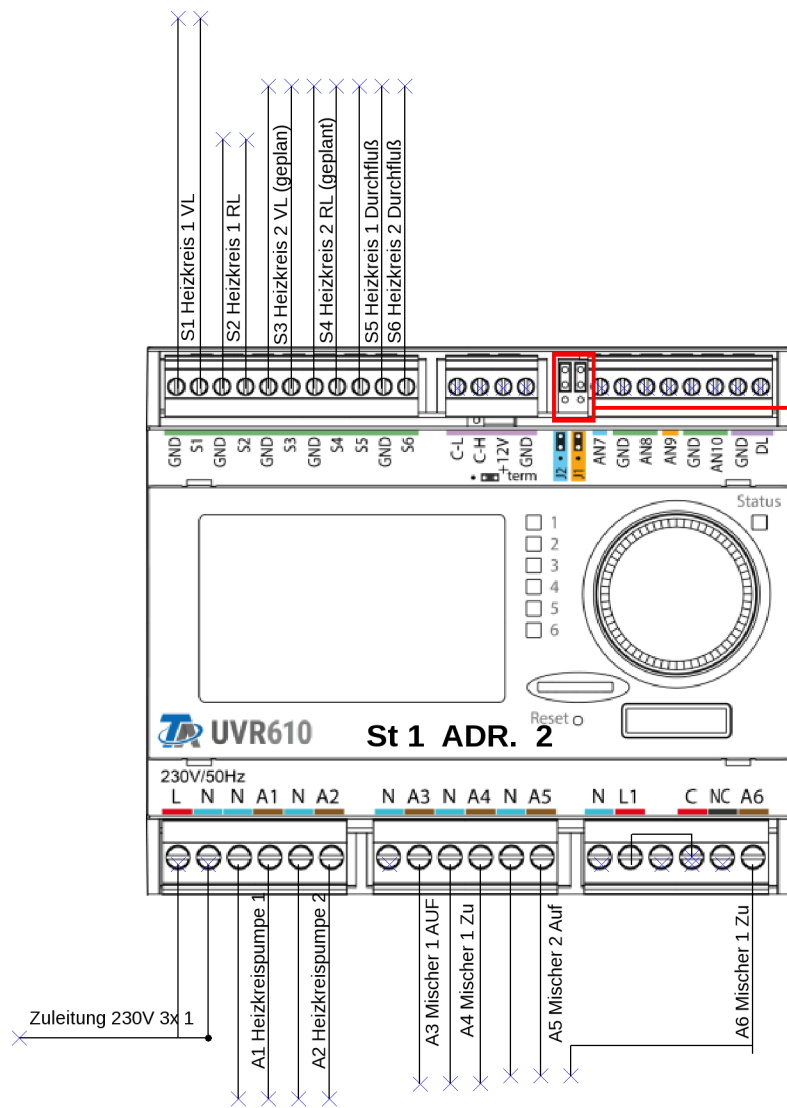

Steuerung 1 UVR 610S MODB

Eingänge St1

S1-1 Heizkreis 1 VL	Kabelfühler 6x 40mm
S1-2 Heizkreis 1 RL	Kabelfühler 6x 40mm
S1-3 Heizkreis 2 VL (geplant)	Kabelfühler 6x 40mm
S1-4 Heizkreis 2 RL (geplant)	Kabelfühler 6x 40mm
S1-5 Heizkreis 1 Durchfluß	
S1-6 Heizkreis 2 Durchfluß (geplant)	

Ausgänge S1

- A1-1 Heizkreispumpe 1
- A1-2 Heizkreispumpe 2
- A1-3 Mischer 1 Auf
- A1-4 Mischer 1 Zu
- A1-5 Mischer 2 Auf (geplant)
- A1-6 Mischer 2 Zu (geplant)
- A1-7 Reserve
- A1-8 Reserve
- A1-9 Reserve
- A1-10 Reserve

Steuerung 1 / 1 Fristr 3 Buslast: 10%

Steuerung 1 TDI5-DL / 2 Buslast: 30%

DL1/1 S1 P1 Oben 1	Kabelfühler 6x 40mm
DL1/1 S2 P1 Oben2	Kabelfühler 6x 40mm
DL1/1 S3 P1 Mitte 3	Kabelfühler 6x 40mm
DL1/1 S4 P1 Unten 1	Kabelfühler 6x 40mm
DL1/1 S5 P1 Unten 2	Kabelfühler 6x 40mm

Steuerung 1 PRS06-DL / 3 Buslast: 13%

DL1/2 S1 Druck Anlage

DL1/3 RAS-DL unten Buslast: 10%

DL1/4 RAS-DL oben Buslast: 10%

Steuerung 2 UVR 610 OD

Eingänge St2

S2-1 Ölkessel Durchfluss	
S2-2 Holzöfen Durchfluss	
S2-3 Rauchgas EG	
S2-4 VL Holzöfen Summe	
S2-5 Temp RLA Holzöfen	Kabelfühler 5x 50mm
S2-6 RL Ölkessel / BHKW	

Ausgänge S2

- A2-1 Mischer RLA Auf
- A2-2 Mischer RLA Zu
- A2-3 Pumpe 230V Holzofen 2
- A2-4 Pumpe 230V Holzofen 1
- A2-5 Pumpe 230V Kessel
- A2-6 Anforderung Ölkessel
- A2-7 PWM Kesselpumpe
- A2-8 PWM Holzofen EG 1
- A2-9 PWM Holzofen OG 2
- A2-10

Steuerung 2 TDI5-DL / 1 Buslast: 30%

DL2/1 S1 Puffer Oben 1	Kabelfühler 6x 40mm
DL2/1 S2 Puffer Oben2	Kabelfühler 6x 40mm
DL2/1 S3 Puffer Mitte 3	Kabelfühler 6x 40mm
DL2/1 S4 Puffer Unten 2	Kabelfühler 6x 40mm
DL2/1 S5 T.Speicherumschichtung < ->	

Steuerung 2 TDI5-DL / 2 Buslast: 30%



DL2/2 S1 Abgas Ofen EG	geplant
DL2/2 S2 Abgas Ofen OG	geplant
DL2/2 S3 Ofen EG 1 VL	bleibt
DL2/2 S4 Ofen OG 2 VL	bleibt
DL2/2 S5 Außen	01/AUSPT Außenfühler

NEU

Steuerung 2 TDI5-DL / 3 Buslast: 30%

DL2/3 S1 Ölkessel WT hinten
DL2/3 S2 Ölkessel WT vorn
DL2/3 S3 Ölkessel VL
DL2/3 S4
DL2/3 S5

ÄNDERN

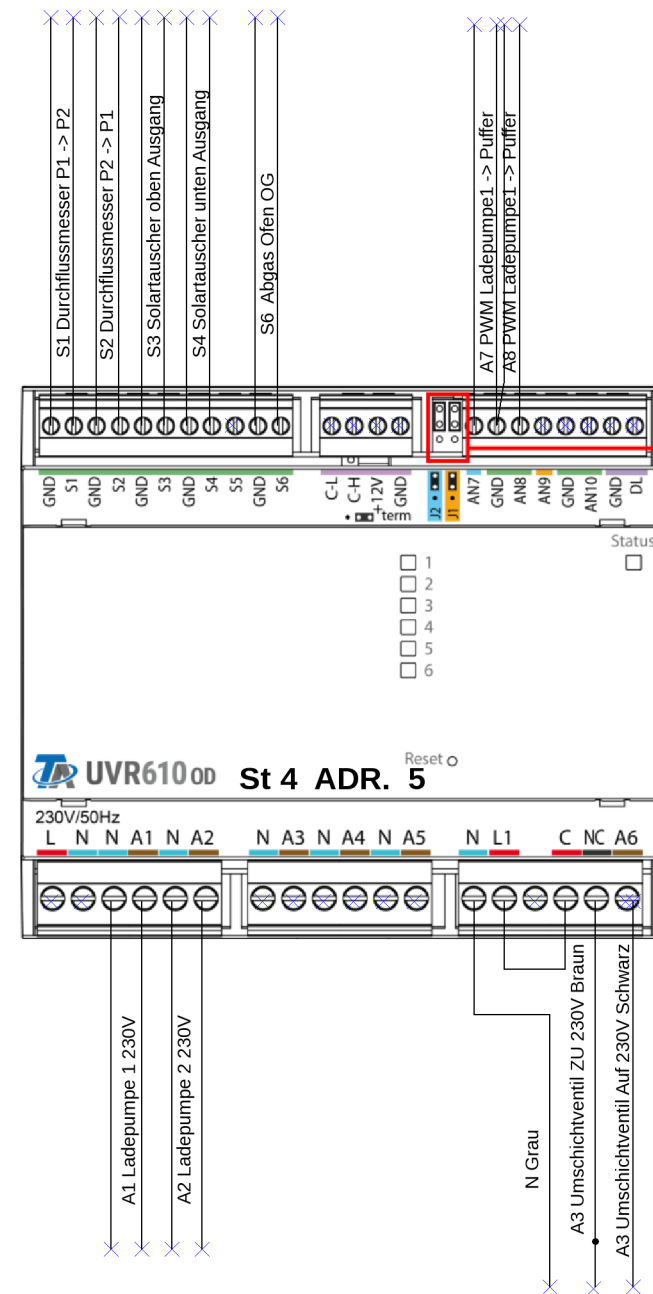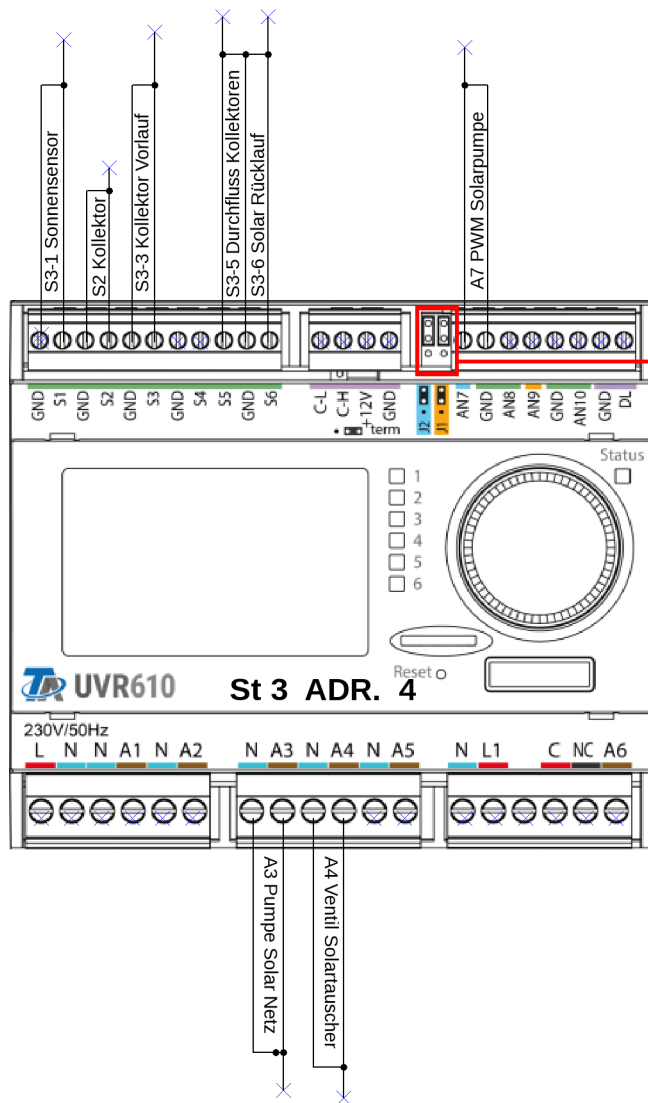

Steuerung 3

UVR 610 S

Eingänge St3

S3-1 Sonnensensor

S3-2 Kollektor

S3-3 Kollektor Vorlauf

S3-4

S3-5 Durchfluss Kollektoren

S3-6 Solar Rücklauf Kabelfühler 5x 50mm

Ausgänge S3

A3-1

A3-2

A3-3 Pumpe Solar Netz

A3-4 Ventil Solartauscher

A3-5

A3-6

A3-7 PWM Solarpumpe

A3-8 PWM

A3-9 PWM

A3-10

Steuerung 3 PRS0-6-DL / 2 Buslast: 13%

DL3/1 S5 Druck Solaranlage

Steuerung 3 TDI5-DL / 1 Buslast: 30%

DL3/2 S1 Solartauscher oben Ausgang Kabelfühler 5x 50mm

DL3/2 S2 Solartauscher unten Ausgang Kabelfühler 5x 50mm

DL3/2 S3 Kabelfühler 6x 40mm

DL3/2 S4 Kabelfühler 6x 40mm

DL3/2 S5 Kabelfühler 5x 50mm

Steuerung 4

UVR 610 OD

Eingänge St4

S4-1 Durchflussmesser P1 -> P2

S4-2 Durchflussmesser P2 -> P1

S4-3 Durchfluss Warmwasser oben

S4-4 Durchfluss Warmwasser unten

S4-5 Kanalfühler

S4-6 Abgasfühler OG

A4-1 Ladepumpe 1 230V

A4-2 Ladepumpe 2 230V

A4-3 Anforderung BHKW

A4-4

A4-5

A4-6 Anforderung BHKW

A4-7 PWM Ladepumpe1 -> Puffer

A4-8 PWM Ladepumpe2 -> Speicher

A4-9

A4-10

Steuerung 4 IS-DL1 / Buslast 19%

Strommessung Heizung / Ölkessel

Steuerung 4 LST2x2-DL / 1 Buslast 10%

Leistungssteller Lüfter

